





































标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		四	五	六	日
1		项目启动	3 个工作日	2019年3月1日	2019年3月5日							
2		组建核心团队	1 个工作日	2019年3月1日	2019年3月1日		项目经理					
3		分析干系人利益	1 个工作日	2019年3月1日	2019年3月1日		项目经理 [50%]					
4		制定项目功能	1 个工作日	2019年3月1日	2019年3月1日		产品经理					
5		里程碑计划	1 个工作日	2019年3月4日	2019年3月4日	2, 3, 4	项目经理					
6		项目启动大会	1 个工作日	2019年3月5日	2019年3月5日	5	项目经理					
7		项目规划	16 个工作日	2019年3月6日	2019年3月27日							
8		规划范围	4 个工作日	2019年3月6日	2019年3月11日							
9		制定需求规格说明书	1 个工作日	2019年3月6日	2019年3月6日	6	项目经理					
10		范围说明书	1 个工作日	2019年3月7日	2019年3月7日	9	项目经理					
11		界面设计	1 个工作日	2019年3月7日	2019年3月7日	9	UI设计师					
12		设计详细说明书	1 个工作日	2019年3月7日	2019年3月7日	9	产品经理					
13		创建WBS	1 个工作日	2019年3月8日	2019年3月8日	10, 11, 12	产品经理					
14		形成范围基准	1 个工作日	2019年3月11日	2019年3月11日	13	产品经理					
15		规划时间	4 个工作日	2019年3月12日	2019年3月15日							
16		模块时间规划	1 个工作日	2019年3月12日	2019年3月12日	14	产品经理					
17		排列工作顺序	1 个工作日	2019年3月13日	2019年3月13日	16	产品经理					
18		制定进度计划	1 个工作日	2019年3月14日	2019年3月14日	17	产品经理					
19		规划质量	2 个工作日	2019年3月16日	2019年3月18日							
20		指定测试计划	1 个工作日	2019年3月15日	2019年3月15日	18	测试专家					
21		制定测试用例	1 个工作日	2019年3月18日	2019年3月18日	20	测试专家					
22		规划人力资源	2 个工作日	2019年3月21日	2019年3月22日							
23		制定人员任务分配计划	1 个工作日	2019年3月19日	2019年3月19日	21	项目经理					
24		资源环境统一计划	1 个工作日	2019年3月20日	2019年3月20日	23	项目经理					
25		规划沟通	1 个工作日	2019年3月23日	2019年3月23日							
26		制定沟通管理计划	1 个工作日	2019年3月21日	2019年3月21日	24	项目经理					
27		规划风险	3 个工作日	2019年3月24日	2019年3月26日							
28		识别风险	1 个工作日	2019年3月24日	2019年3月24日	15, 19, 22, 25	风险分析师					
29		分析风险	1 个工作日	2019年3月25日	2019年3月25日	28	风险分析师					
30		制定风险登记册	1 个工作日	2019年3月26日	2019年3月26日	29	风险分析师					
31		整合规划	1 个工作日	2019年3月27日	2019年3月27日							
32		制定整合顺序计划	1 个工作日	2019年3月27日	2019年3月27日	30	产品经理					
33		项目开发	25 个工作日	2019年3月28日	2019年5月1日							

项目：青蓝家教网站  
日期：2019年4月5日



















任务	非活动任务	手动摘要总成	外部里程碑
拆分	非活动里程碑	手动摘要	最后期限
里程碑	非活动摘要	仅开始时间	进度
摘要	手动任务	仅完成时间	手动进度
项目摘要	仅工期	外部任务	


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	四	五	六	日	
34		 组建项目开发团队	1 个工作日	2019年3月28日	2019年3月28日	7	项目经理					
35		 项目执行	21 个工作日	2019年3月29日	2019年4月26日							
36		 家教信息发布模块	3 个工作日	2019年3月29日	2019年4月2日							
37		 家教信息发布	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日	34	技术人员					
38		 家教老师分布	1 个工作日	2019年4月1日	2019年4月1日	37	技术人员					
39		 家教老师信息介绍	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	38	技术人员					
40		 找家教模块	5 个工作日	2019年4月3日	2019年4月9日							
41		 咨询索引	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	34	技术人员					
42		 咨询师介绍	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	41	技术人员					
43		 咨询师预约	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	42	技术人员					
44		 付款功能	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	43	技术人员					
45		 咨询方式分类及实现	1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	44	技术人员					
46		 评分模块	5 个工作日	2019年4月10日	2019年4月16日							
47		 课程评分	1 个工作日	2019年4月10日	2019年4月10日	34	技术人员					
48		 家教老师评分	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	47	技术人员					
49		 学生表现情况	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	48	技术人员					
50		 学生作业评分	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	49	技术人员					
51		 总体评分	1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日	50	技术人员					
52		 个人中心模块	7 个工作日	2019年4月17日	2019年4月25日							
53		 用户模块	3 个工作日	2019年4月17日	2019年4月19日							
54		 个人信息展示及修改	1 个工作日	2019年4月17日	2019年4月17日	34	技术人员					
55		 最新动态	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	54	技术人员					
56		 找家教历程	1 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日	55	技术人员					
57		 家教老师模块	4 个工作日	2019年4月20日	2019年4月24日							
58			 个人信息展示及修改	1 个工作日	2019年4月20日	2019年4月20日	34					技术人员
59			 发表课程及管理	1 个工作日	2019年4月22日	2019年4月22日	58					技术人员
60			 发表文章及管理	1 个工作日	2019年4月23日	2019年4月23日	59					技术人员
61			 订单展示	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日	60					技术人员
62		 项目测试	3 个工作日	2019年4月25日	2019年4月29日							
63		 制定测试用例	1 个工作日	2019年4月25日	2019年4月25日	34	测试人员					
64			 测试评审	1 个工作日	2019年4月28日	2019年4月28日	63					测试人员
65			 例会	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	64					项目经理
66		 管理干系人	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日							

项目：青蓝家教网站  
日期：2019年4月5日


任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	四	五	六	日
67		 发布项目信息	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	34	项目经理				
68		 报告测试信息	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	34	测试人员				
69		 干系人沟通	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	34	项目经理				
70		 团队建设	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日						
71	 娱乐活动	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	34						
72	 团队沟通	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	34						
73	 项目验收	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	35	产品经理					
74	 项目收尾	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日							
75		 项目最终测验	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	73	项目经理				
76		 项目内部收尾	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	73	项目经理				
77		 项目提交	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	73	项目经理				

项目：青蓝家教网站 日期：2019年4月5日	任务 拆分 里程碑 摘要 项目摘要	    	非活动任务 非活动里程碑 非活动摘要 手动任务 仅工期	   	手动摘要总成 手动摘要 仅开始时间 仅完成时间 外部任务	    	外部里程碑 最后期限 进度 手动进度	   
---------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

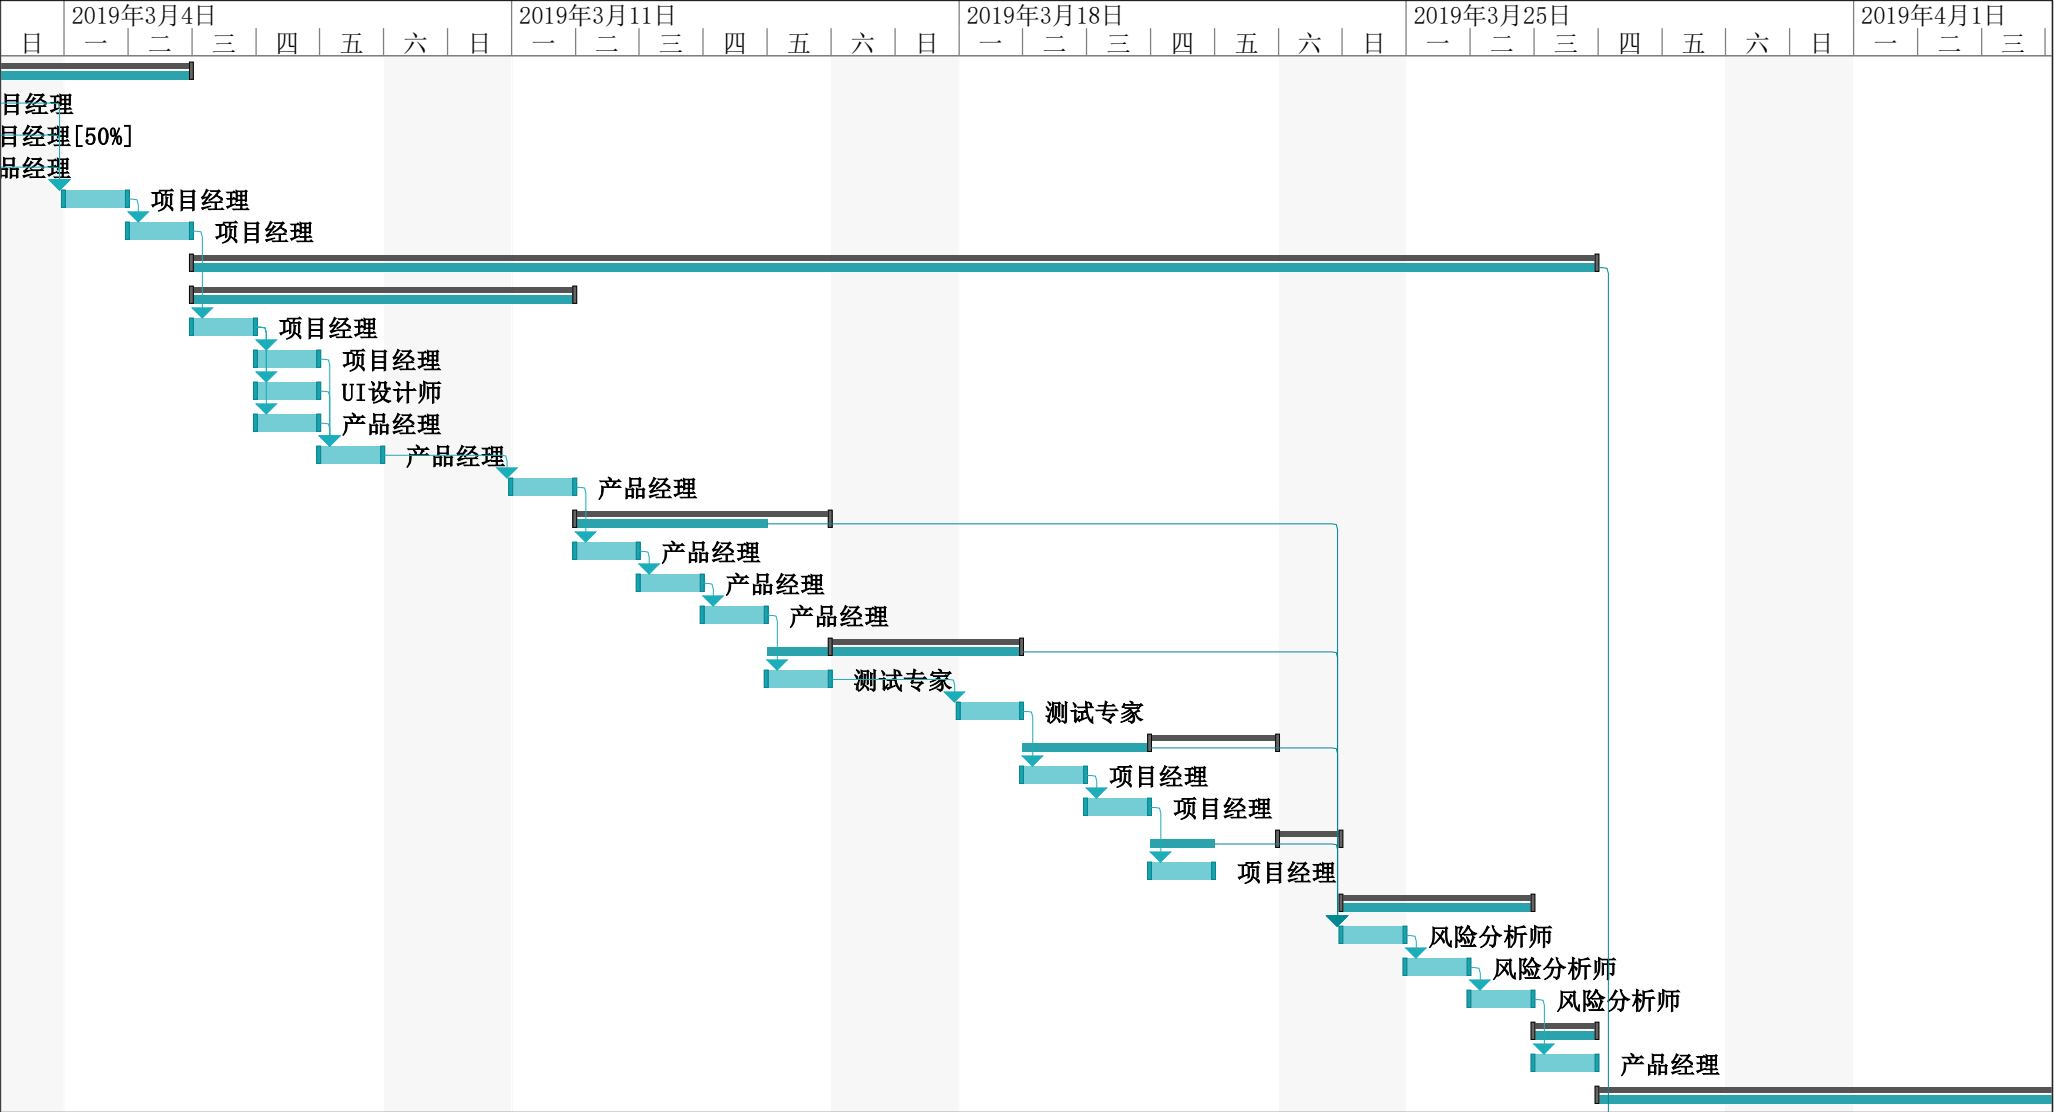

项目：青蓝家教网站 日期：2019年4月5日	任务		非活动任务		非活动里程碑		手动摘要		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		外部里程碑		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度			
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度			
	项目摘要		仅工期		外部任务					

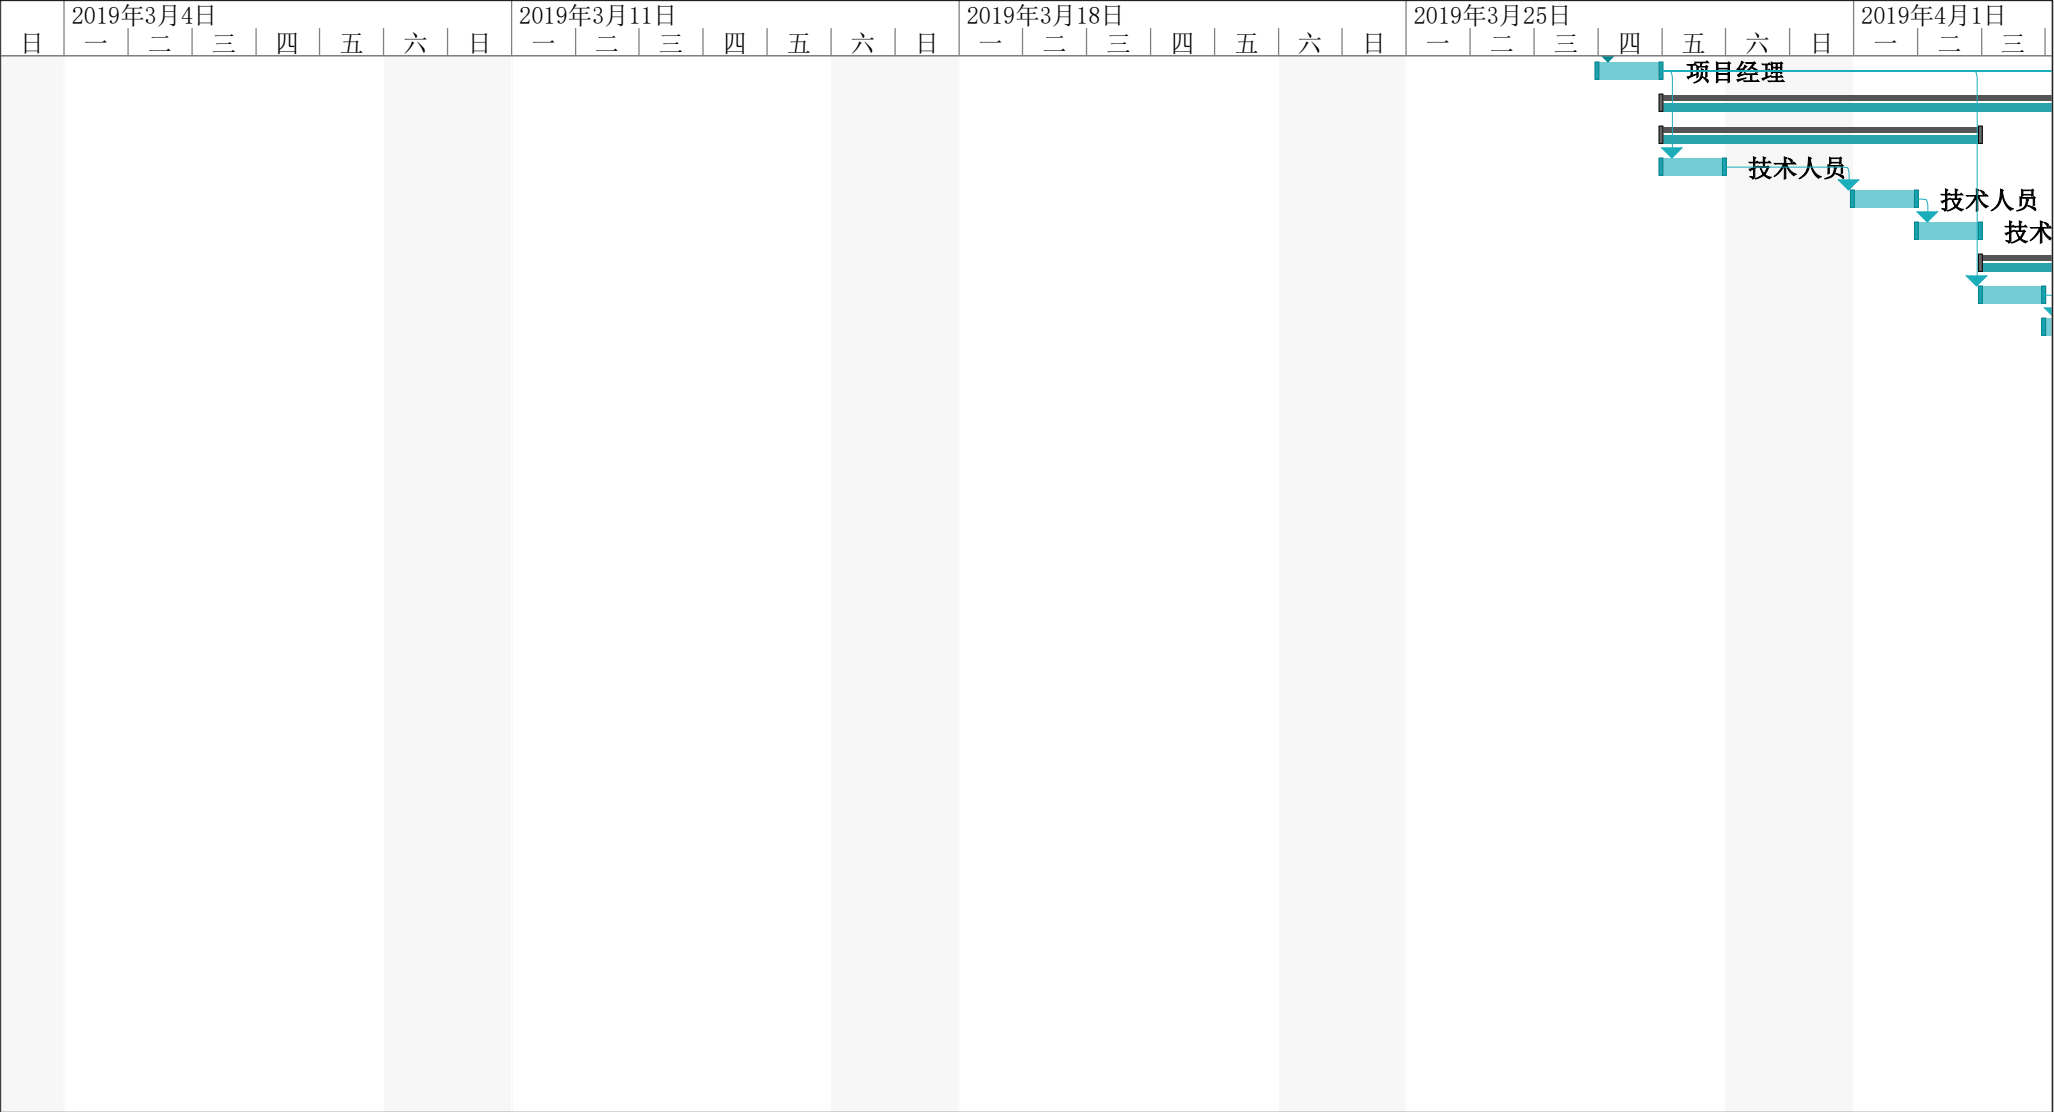


项目：青蓝家教网站 日期：2019年4月5日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

2019年3月4日							2019年3月11日							2019年3月18日							2019年3月25日							2019年4月1日			
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三
<div>项目：青蓝家教网站 日期：2019年4月5日</div>						任务	<div></div>	非活动任务		手动摘要总成	<div></div>	外部里程碑	<div></div>																		
						拆分	<div></div>	非活动里程碑	<div></div>	手动摘要	<div></div>	最后期限	<div></div>																		
						里程碑	<div></div>	非活动摘要	<div></div>	仅开始时间	<div></div>	进度	<div></div>																		
						摘要	<div></div>	手动任务	<div></div>	仅完成时间	<div></div>	手动进度	<div></div>																		
						项目摘要	<div></div>	仅工期	<div></div>	外部任务	<div></div>																				



[illegible]

项目：青蓝家教网站  
日期：2019年4月5日

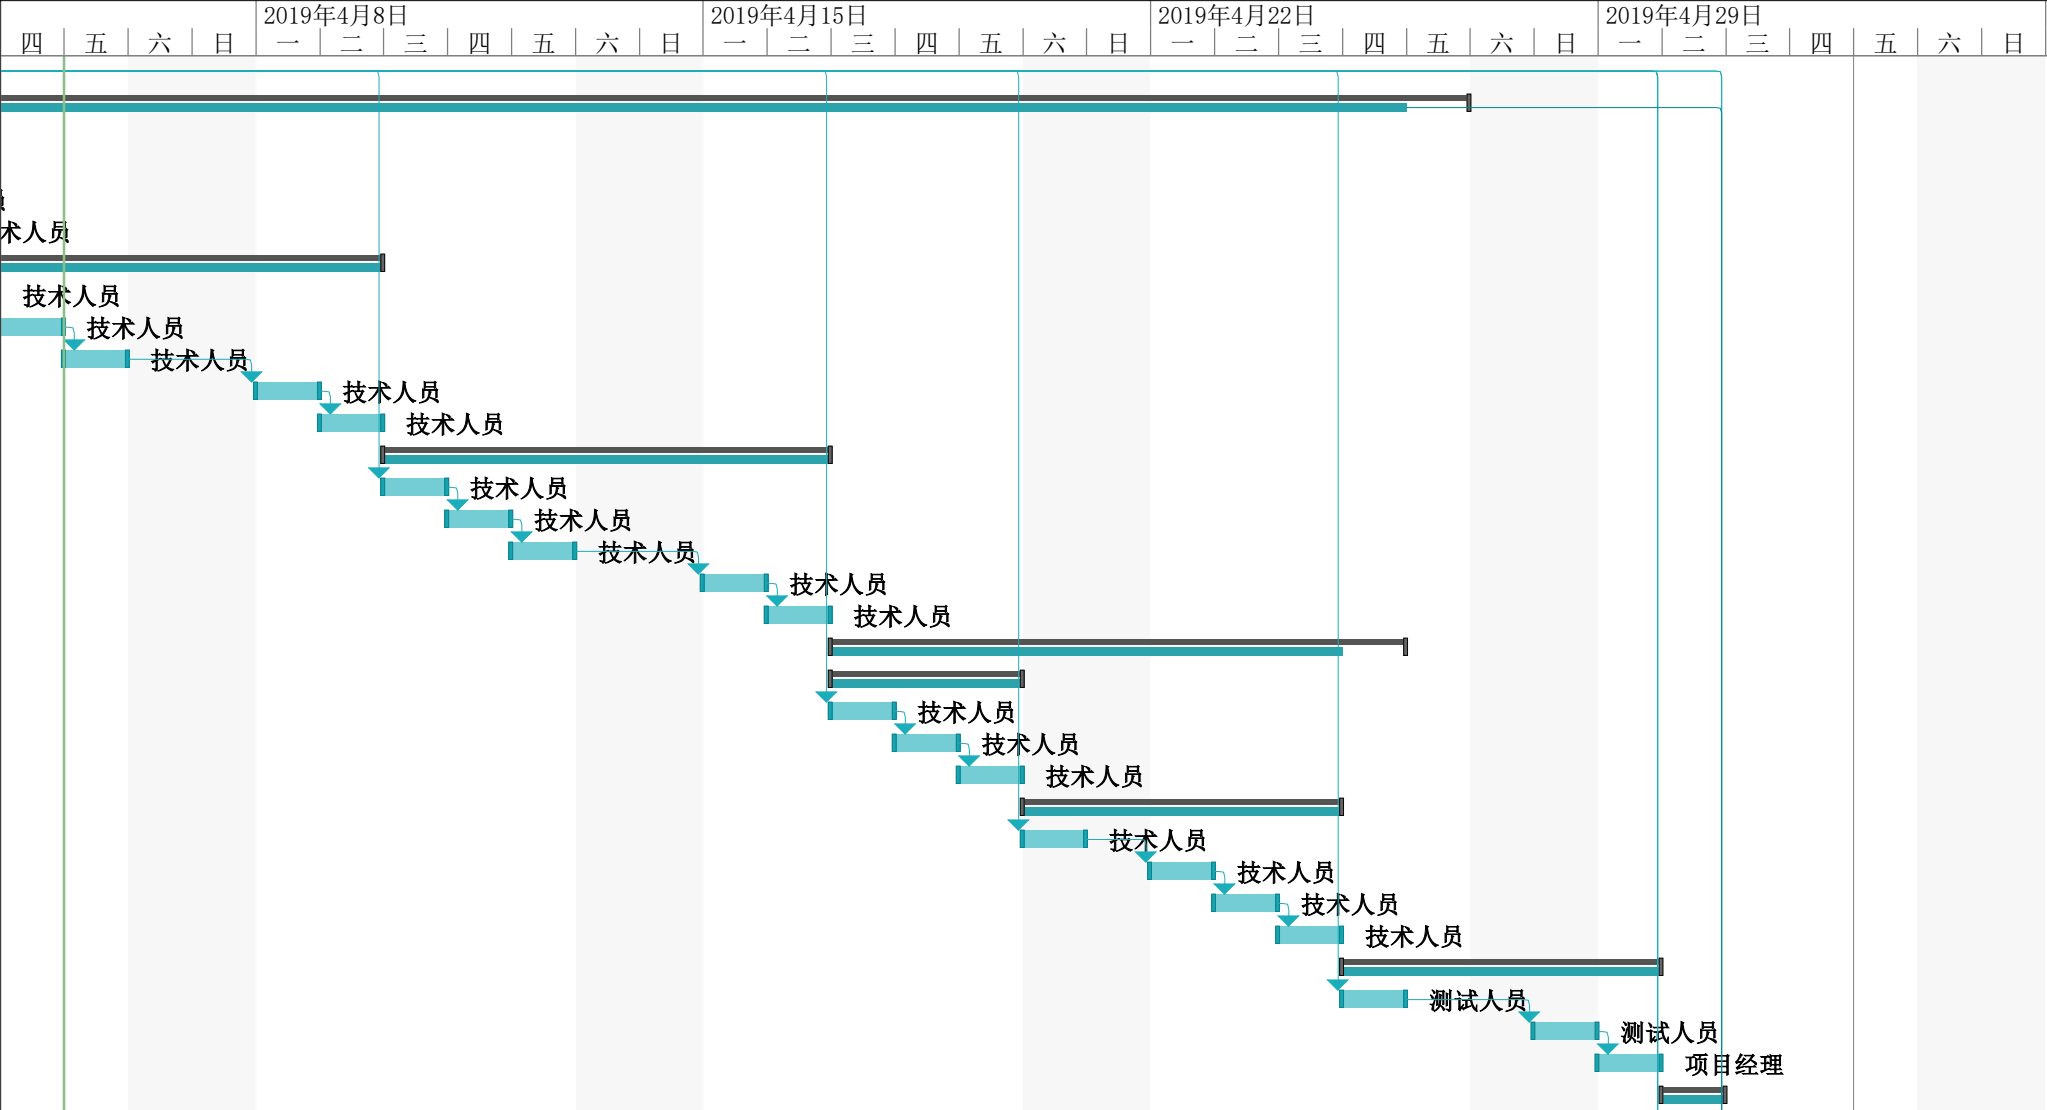任务	非活动任务	手动摘要总成	外部里程碑
拆分	非活动里程碑	手动摘要	最后期限
里程碑	非活动摘要	仅开始时间	进度
摘要	手动任务	仅完成时间	手动进度
项目摘要	仅工期	外部任务	



项目：青蓝家教网站  
日期：2019年4月5日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务	
